

Id	Milep	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Afhængighe
1		**Kontraktunderskrift**	**1 dag**	**on 21-01-26**	**on 21-01-26**	
2	M0	Underskrivelse af kontrakt	1 dag	on 21-01-26	on 21-01-26	
3		**Afklaringsfase**	**19,5 dage**	**to 22-01-26**	**on 25-02-26**	**1**
4		Introduktion til parternes projektorganisation og etablering af samarbejdsorganisation	0,5 dage	to 22-01-26	to 22-01-26	2
5		**Projektstyring**	**9,5 dage**	**fr 23-01-26**	**to 05-02-26**	
6		**Afklaringsforløb for risikovurdering**	**8,5 dage**	**fr 23-01-26**	**on 04-02-26**	
7		Møde om risikovurdering	0,5 dage	fr 23-01-26	fr 23-01-26	4AS+1 dag
8		Løbende dialog og tilpasning til risikovurdering	7 dage	ma 26-01-26	ti 03-02-26	7
9		Afklaring af endeligt risikoniveau for servicen	1 dag	on 04-02-26	on 04-02-26	8
10		**Afklaringsforløb for implementeringstidsplan**	**8,5 dage**	**ma 26-01-26**	**to 05-02-26**	
11		Afklaringsmøde om implementeringstidsplan	0,5 dage	ma 26-01-26	ma 26-01-26	4AS+2 dage
12		Afklaring af uddannelsesforløb og planlægning	0,25 dage	ti 27-01-26	ti 27-01-26	11
13		Indarbejdelse af aftalte ændringer i implementeringstidsplan	5 dage	ti 27-01-26	ma 02-02-26	11
14		Fremsendelse af revideret implementeringstidsplan til Kunden	0 dage	ma 02-02-26	ma 02-02-26	13
15		Godkendelse af implementeringstidsplan	3 dage	ti 03-02-26	to 05-02-26	14
16		**Afklaringsforløb for betalingsplan**	**8,5 dage**	**ma 26-01-26**	**to 05-02-26**	
17		Møde om betalingsplan	0,5 dage	ma 26-01-26	ma 26-01-26	4AS+2 dag
18		Udarbejdelse af betalingsplan	5 dage	ti 27-01-26	ma 02-02-26	17
19		Fremsendelse af betalingsplan	0 dage	ma 02-02-26	ma 02-02-26	18
20		Godkendelse af betalingsplan	3 dage	ti 03-02-26	to 05-02-26	19
21		**Afklaringsforløb om Kundens IT-miljø**	**9,5 dage**	**ti 27-01-26**	**ma 16-02-26**	
22		Teknisk workshop om Kundens IT-miljø og krav til samme	0,5 dage	ti 27-01-26	ti 27-01-26	4AS+3 dage
23		Udarbejdelse af evt. præciseringer og/eller suppleringer til krav og forhold om Kundens IT-miljø	5 dage	on 28-01-26	ti 03-02-26	22
24		Fremsendelse af evt. Præciseringer og/eller suppleringer til forhold om Kundens IT-miljø	0 dage	ti 03-02-26	ti 03-02-26	23
25		Godkendelse af præciseringer og/eller suppleringer til forhold om Kundens IT-miljø	1 dag	ma 16-02-26	ma 16-02-26	24AS+3 dage
26		**Afklaringsforløb om integrationer**	**8,5 dage**	**on 28-01-26**	**ma 16-02-26**	
27		Teknisk workshop om standardintegrationer og Calypso	0,5 dage	on 28-01-26	on 28-01-26	4AS+4 dage
28		Udarbejdelse af evt. præciseringer og/eller suppleringer til krav og forhold til standardintegrationer og Calypso	5 dage	to 29-01-26	on 04-02-26	27
29		Fremsendelse af evt. Præciseringer og/eller suppleringer til forhold til standardintegrationer og Calypso	0 dage	to 05-02-26	to 05-02-26	28
30		Godkendelse af præciseringer og/eller suppleringer til forhold til standardintegrationer og Calypso	3 dage	to 05-02-26	ma 16-02-26	29
31		**Løsningens funktioner og konfigurationsmuligheder**	**16 dage**	**ma 26-01-26**	**ti 24-02-26**	
32		Workshop vedr. konfigurationsmuligheder i Løsningen	1 dag	ma 26-01-26	ti 27-01-26	4AS+2 dage
33		Afklaringsworkshop vedr. specifikke funktionelle områder (Fx Teams, aktindsigt og kontrakthåndtering)	1 dag	ti 27-01-26	on 28-01-26	32
34		Konfigurationsworkshop - Kundespecifik konfiguration	1 dag	on 28-01-26	to 29-01-26	33
35		Udarbejdelse og dokumentation af Løsningsdesign	5 dage	to 29-01-26	to 05-02-26	34
36		Fremsendelse af Løsningsdesign til Kundens godkendelse	0 dage	to 05-02-26	to 05-02-26	35
37		Kundens review af Løsningsdesign	5 dage	to 05-02-26	to 19-02-26	36
38		Håndtering af Kundens evt. kommentarer til ESDH-løsningsdesign	3 dage	to 19-02-26	ti 24-02-26	37
39	M1	Godkendt Løsningsdesign	1 dag	ti 24-02-26	on 25-02-26	38
40	M2	**Afslutning af afklaringsfasen**	0 dage	on 25-02-26	on 25-02-26	39
41		**Etablering af miljøer**	**16,5 dage**	**to 22-01-26**	**fr 20-02-26**	
42		Etablering af test- og produktionsmiljø samt migreringsmiljø (servere, basissoftware og testklienter)	15 dage	to 22-01-26	on 18-02-26	2
43		Installation af standardprogrammel (Public 360° + relevante moduler) og basiskonfiguration I test- og produktionsmiljø	1 dag	to 19-02-26	to 19-02-26	42
44		Installationstest I Kundens test- og produktionsmiljø	0,5 dage	fr 20-02-26	fr 20-02-26	43
45		**Implementeringsfasen**	**102,5 dage**	**on 25-02-26**	**to 20-08-26**	
46		**Etablering af Kundens ESDH-Service**	**102,5 dage**	**on 25-02-26**	**to 20-08-26**	
47		**Implementering af den kundespecifikke konfiguration og gennemførsel af Leverandørens egne prøver**	**62,5 dage**	**on 25-02-26**	**on 03-06-26**	
48		Implementering af kundespecifik konfiguration + udarbejdelse af Testcases	20 dage	on 25-02-26	on 25-03-26	39
49		Implementering af relevante standardintegrationer (CVR, CPR og Digital Post)	1 dag	on 25-03-26	to 26-03-26	48
50		Implementering af Kundespecific integration (Calypso)	3 dage	ti 05-05-26	to 07-05-26	48AS+1 dag
51		Fremsendelse af leverandørens Testplan	1 dag	fr 08-05-26	fr 08-05-26	50
52		Kundens godkendelse af Leverandørens testplan og testcases	3 dage	ma 11-05-26	on 13-05-26	50AS+1 dag
53		Leverandørens test på Kundens testmiljø	10 dage	fr 15-05-26	fr 29-05-26	52
54		Fremsendelse af Leverandørens Testrapport	0 dage	fr 29-05-26	fr 29-05-26	53
55	M3	Godkendelse af Leverandørens Testrapport	3 dage	ma 01-06-26	on 03-06-26	53
56		**Datamigrering**	**101,5 dage**	**to 26-02-26**	**to 20-08-26**	

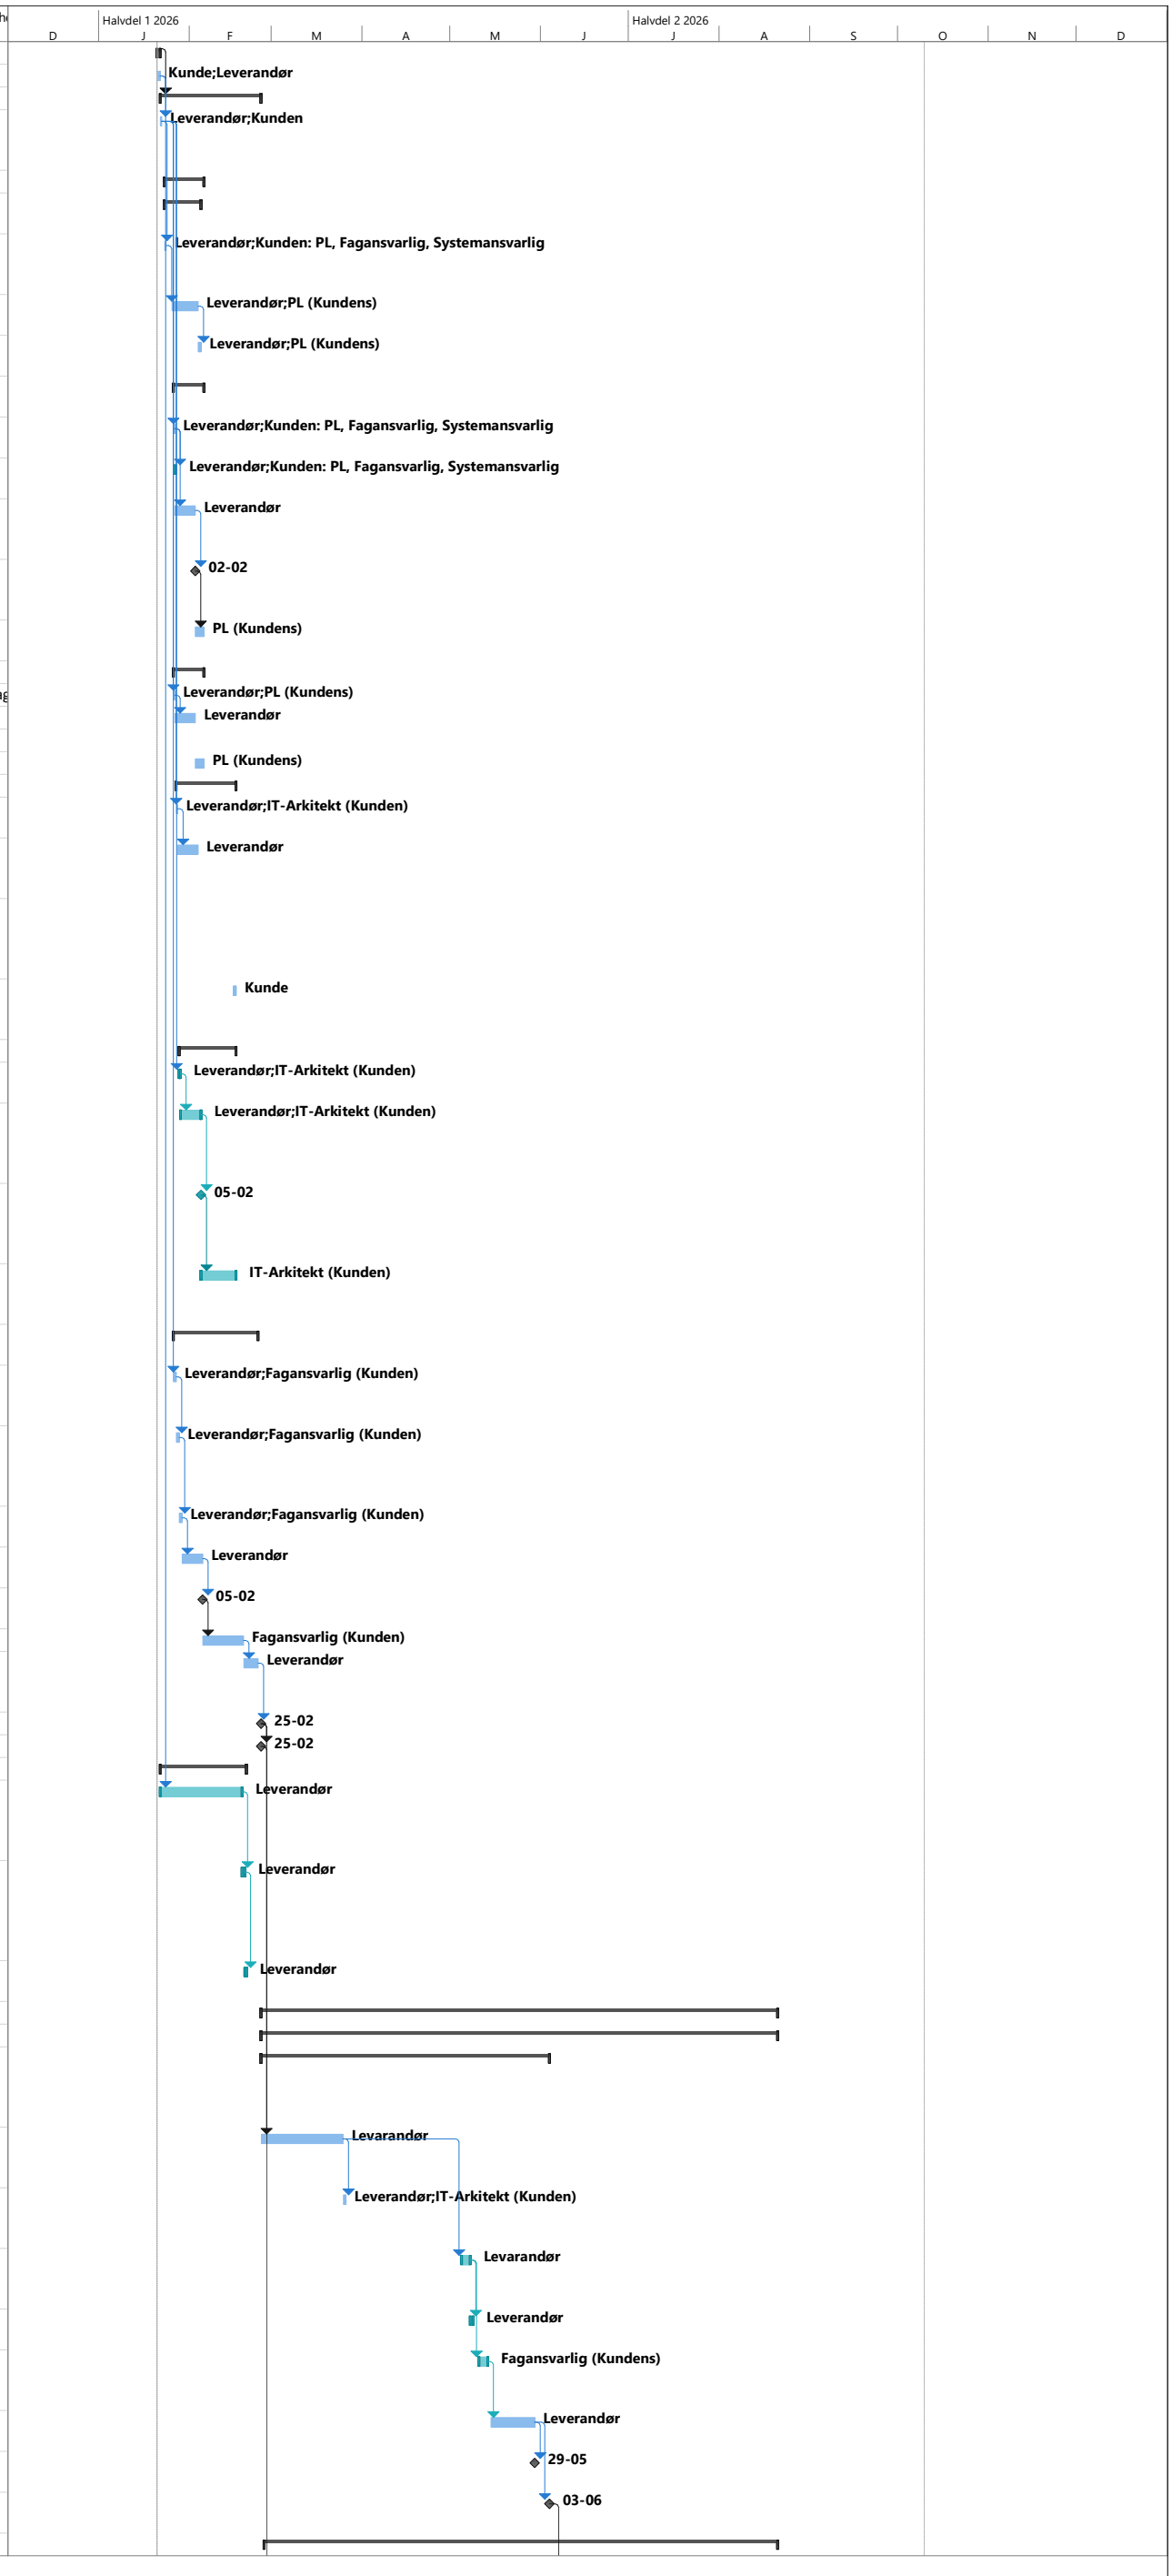

Project: Implementeringstidspla
Date: sø 23-11-25

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

Id	Milep	Aktivitet	Varighed	Startdato	Slutdato	Afhængighe
57		**Fastlæggelse af udtræksformat og modtagelse af dataudtræk**	**15,25 dage**	**to 26-02-26**	**to 19-03-26**	
58		Møde om udtræksformat med Kundens eksisterende leverandør af ESDH-Service 'TeamShare'	0,25 dage	to 26-02-26	to 26-02-26	40AS+1 dag
59		Modtagelse af data i aftalt format fra Kundens eksisterende ESDH-Service "Teamshare"	0 dage	to 19-03-26	to 19-03-26	58AS+15 dage
60		**Migrering af data til Kundens nye Løsning**	**86,25 dage**	**to 19-03-26**	**to 20-08-26**	
61		Udarbejdelse af mapningsdokumenter for data fra eksisterende løsninger	15 dage	to 19-03-26	fr 17-04-26	59
62		Konverterings- og mapningsworkshop omhandlende data fra eksisterende ESDH-løsning "Teamshare"	1 dag	fr 17-04-26	ma 20-04-26	61
63		Kundens behandling af evt. udestående mapninger efter workshops	5 dage	ma 20-04-26	ma 27-04-26	62
64		Udarbejdelse af scripts til migrering af data fra Kundens eksisterende løsninger	15 dage	ma 27-04-26	ti 19-05-26	63
65		ESDH løsningens Kundespecifikke konfiguration lægges på migreringsmiljøet	3 dage	ma 08-06-26	on 10-06-26	55AS+1 dag
66		Gennemførsel af prøvemigrering fra Kundens eksisterende løsninger og Leverandørens test af samme	15 dage	to 11-06-26	on 22-07-26	65
67		Konverteringstest af prøvemigrering fra Kundens eksisterende løsninger	5 dage	to 23-07-26	on 29-07-26	66
68		Evt. anden iteration af migreringsspor med ny konverteringstest	15 dage	to 30-07-26	on 19-08-26	67
69	M4	Godkendelse af migrering af data fra Kundens eksisterende løsninger	1 dag	to 20-08-26	to 20-08-26	68
70		**Uddannelse - Aftalt i Afklaringsfasen Nedenstående er et eksempel**	**9 dage**	**on 01-07-26**	**to 30-07-26**	
71		Superbrugerkursus	1 dag	ti 28-07-26	ti 28-07-26	78AS-20 d
72		Train-the-trainerkursus	2 dage	on 29-07-26	to 30-07-26	71
73		E-Learning materiale fremsendes	0 dage	on 01-07-26	on 01-07-26	72
74		**Overtagelsesprøve for Løsningen på Kundens Testmiljø**	**52 dage**	**fr 31-07-26**	**fr 09-10-26**	
75		**Forberedende aktiviteter for overtagelsesprøve**	**17 dage**	**fr 31-07-26**	**ma 24-08-26**	
76		Fremsendelse af drejebog, prøveplan og testcases for overtagelsesprøve	1 dag	fr 31-07-26	fr 31-07-26	69AS-15 dage
77		Godkendelse af drejebog, prøveplan og testcases	5 dage	ma 03-08-26	fr 07-08-26	76
78		Kopiering og restore af database med migrereret data fra konverteringsmiljøet på produktionsmiljø	2 dage	fr 21-08-26	ma 24-08-26	69
79		**Afholdelse af overtagelsesprøve**	**4 dage**	**ti 25-08-26**	**fr 28-08-26**	
80		Svartidstest	1 dag	ti 25-08-26	ti 25-08-26	78
81		Fremsendelse af prøverapport for overtagelsesprøve	0 dage	ti 25-08-26	ti 25-08-26	80
82	M5	Godkendelse af overtagelsesprøve	3 dage	on 26-08-26	fr 28-08-26	81
83		**Lukkevindue og ibrugtagning af Løsningen**	**9 dage**	**ti 01-09-26**	**fr 11-09-26**	
84		Udlevering af opdaterede udtræk i aftalt format fra Kundens eksisterende løsninger	1 dag	ti 01-09-26	ti 01-09-26	82AS+1 dag
85		Migrering af data til Kundens produktionsmiljø	2 dage	on 02-09-26	to 03-09-26	84
86		Kundens endelige verifikationstest af Servicen i lukkevindue	1 dag	fr 04-09-26	fr 04-09-26	85
87	M6	Idriftsættelse af Løsning	0 dage	ma 07-09-26	ma 07-09-26	
88		Fremsendelse af Afslutningsrapport	5 dage	ma 07-09-26	fr 11-09-26	87
89		**Hypercare (3 uger)**	**26 dage**	**ma 07-09-26**	**fr 09-10-26**	
90		Hypercare start	0 dage	ma 07-09-26	ma 07-09-26	87
91	M7	Hypercare slut	15 dage	ma 21-09-26	fr 09-10-26	90

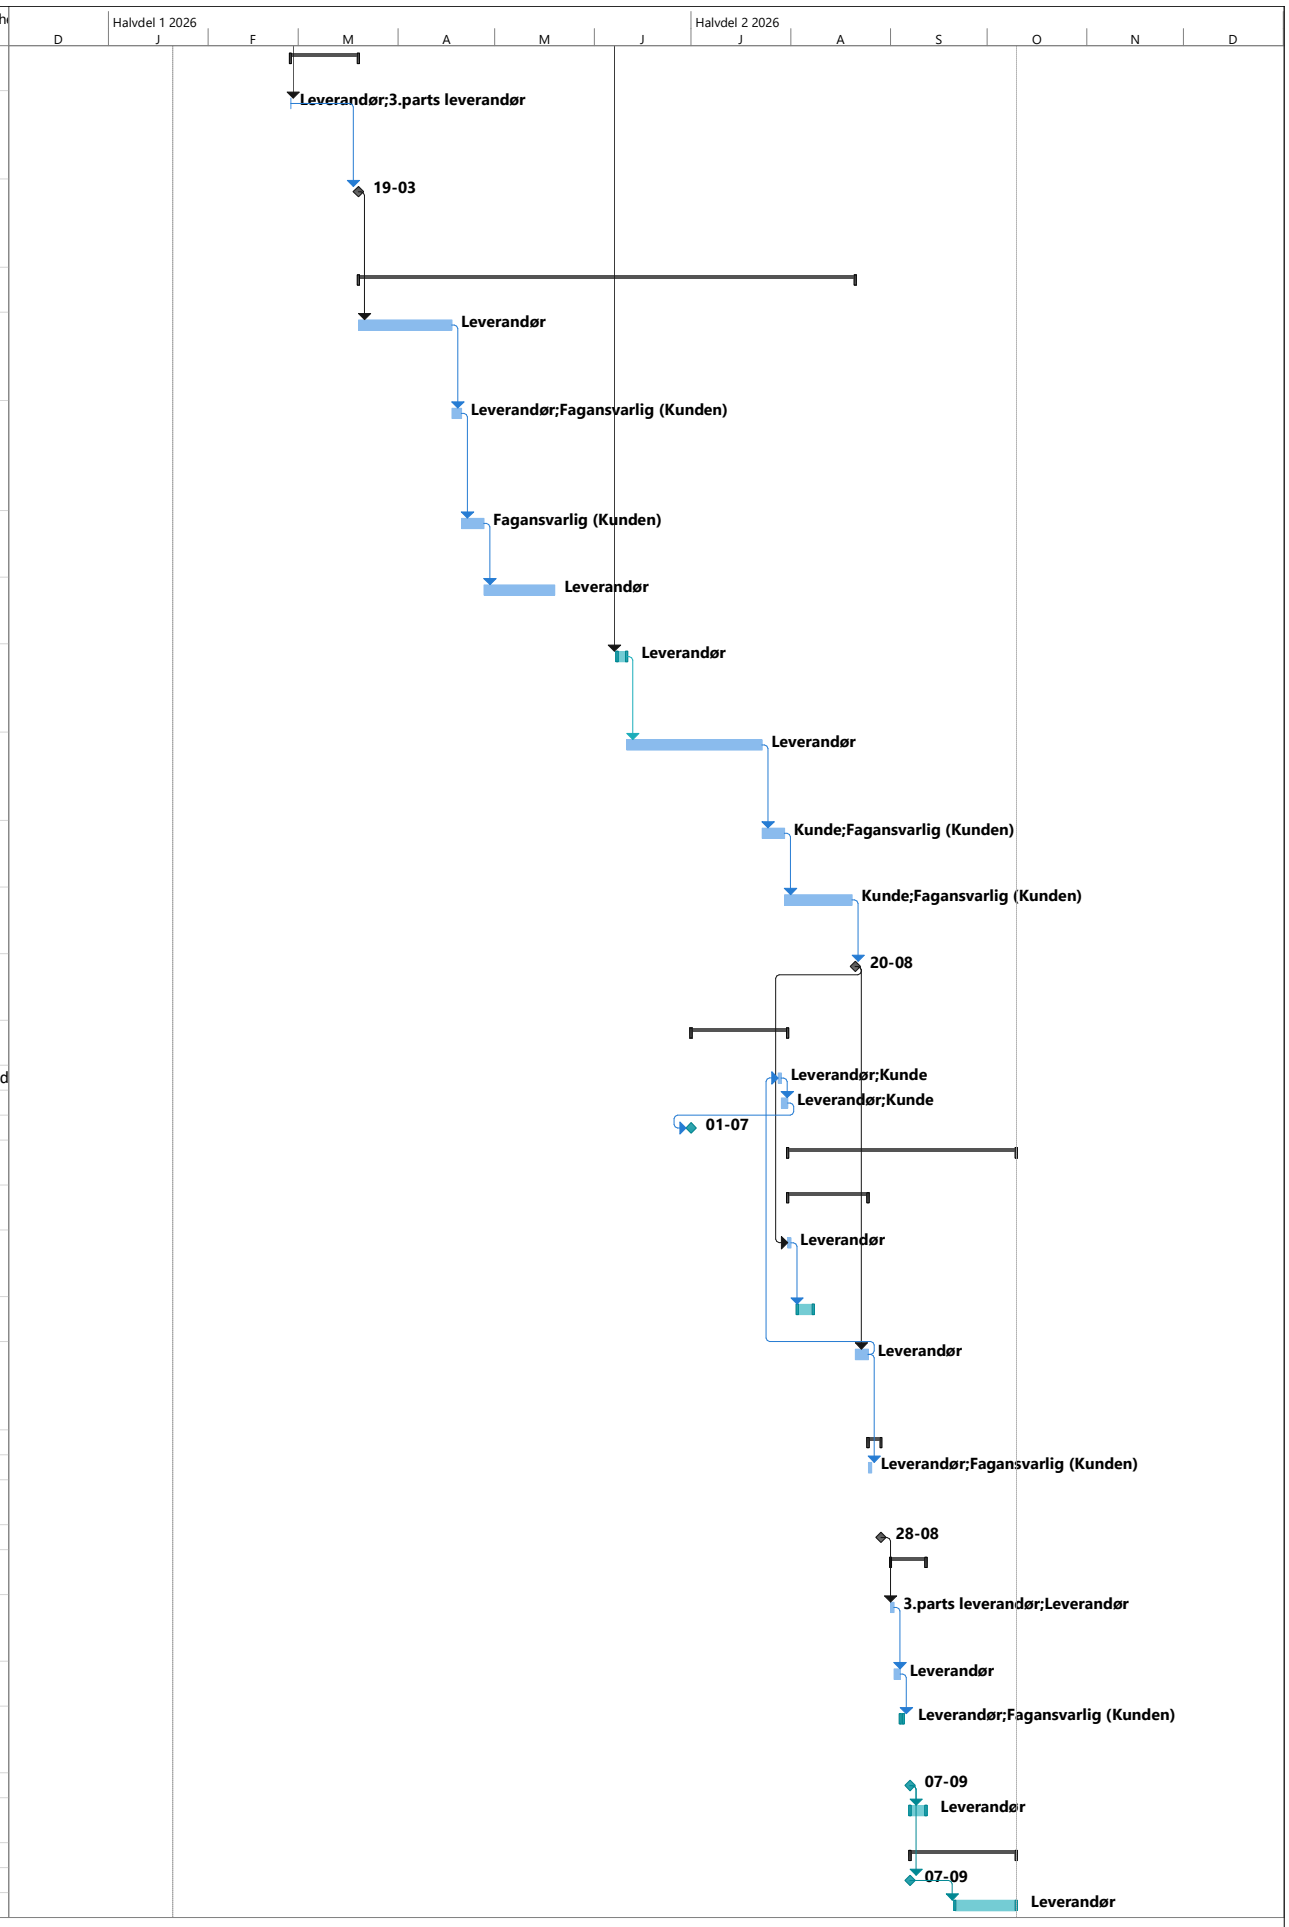

Project: Implementeringstidspla
Date: sø 23-11-25

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone
