Bilag 1.i Leverandørens løsningsbeskrivelse

Dynamisk Indkøbssystem 02.19 Fagsystemer (2024)

Kontrakt om levering af ESDH løsning til Danmarks Nationalbank

SKI0219.2503.0030

Version 2.0

Indhold

1 Indledning 3

2 Besvarelse: Samarbejdsorganisation, herunder Leverandørens roller og procedure for eskalation 4

3 Incident Management 10

4 Supportmanagement, herunder rapportering af fejl 10


1 Indledning

I nærværende bilag angiver Leverandøren løsningsbeskrivelse til Kundens angivet krav i Bilag 1 Organisation og Samarbejde og underbilag 1.1.Servicemål.

2 Besvarelse: Samarbejdsorganisation, herunder Leverandørens roller og procedure for eskalation

Beskrivelse af kompetenceforhold, kommunikationslinjer og ansvarsforhold.

Nedenfor en illustration af kompetenceforhold, kommunikationslinjer og ansvarsforhold mellem Kunden og Leverandøren.

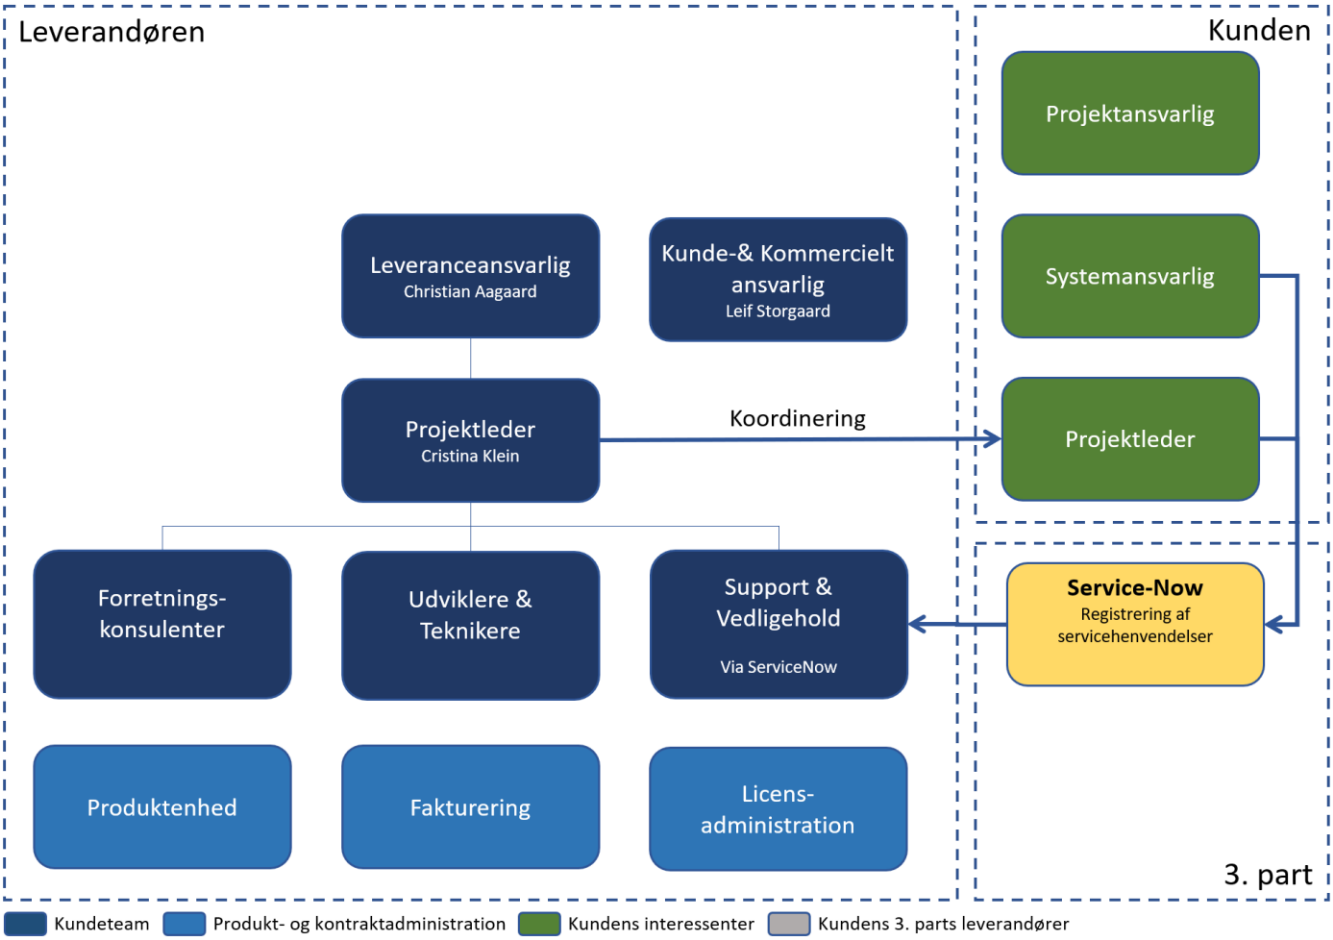

Figur 1

Match af Kundens og Leverandørens leveranceorganisation:

Kundens rolle	*Rollebetegnelse*	*Leverandørens rolle*

Systemejer	*Har det overordnede ansvar for Governance, compliance og godkendelse af krav, løsninger og risikovurderinger i ESDH-systemet.*	*Kunde- og Kommercielt ansvarlig* *Leveranceansvarlig*
Systemansvarlig	*Sikrer den daglige drift og udvikling af ESDH-systemet og samarbejder tæt med*	*Projektleder*
Procesansvarlig	*Afdækker forretningsbehov og definerer krav til systemet. Understøtter og udvikler arbejdsgange i samarbejde med forretningen.*	*Projektleder*
Product Manager og leverandøransvarlig	*Koordinerer leverandørrelationer og driftsteknik. Står for systemvedligeholdelse, fakturahåndtering og tekniske eskalationer.*	*Projektleder*
Contract Manager	*Rådgiver ud fra kontraktens vilkår og håndterer ændringer. Sikrer at banken får de leverancer, den er berettiget til.*	*Kunde- og Kommercielt ansvarlig* *Leveranceansvarlig* *Juridisk afdeling*
Service Delivery Manager	*Tager ejerskab for driftsmodellen og interne fejlmeldingsprocesser. Følger op på SLA'er og sikrer effektiv systemdrift.*	*Projektleder*
Administrator	*Udfører systemadministrative opgaver.*	*Forretningskonsulent*
Superbruger	*Supporterer kolleger i brugen af systemet og deltager i netværk. Holder sig opdateret og deler viden om funktionalitet.*	*Forretningskonsulent*

Beskrivelse af mødestruktur i projektet.

Mødestruktur for projektet er fordelt på

- *Projektledermøder (møder en gang ugentligt eller efter behov)*
- *Styregruppemøder (møder en gang månedligt eller efter behov)*

Projektledermøder

På et projektledermøde drøftes fremdrift, budget, risici og leverancer, hvor projektlederen rapporterer om status til styregruppen og leder den daglige eksekvering ved at fordele opgaver og facilitere statusmøder med arbejdsgrupper. Der koordineres med Leverandører, Kunden og interessenter, og planer og styringsdokumenter opdateres for at sikre projektmålene og styre processen effektivt mod afslutning.

Formål med mødet:

- *At skabe et fælles overblik over projektets status og udfordringer.*
- *At sikre effektiv styring og koordinering af projektets ressourcer og leverancer.*
- *At facilitere de nødvendige beslutninger, så projektet kan bevæge sig fremad mod målene.*
- *At kommunikere vigtig information til styregruppen og øvrige interessenter.*

Typiske aktiviteter på et projektledermøde:

- *Statusrapportering:*
    - *Projektlederen præsenterer projektets fremdrift, herunder tidsforbrug, økonomi og eventuelle afvigelser fra planerne.*
- *Risikostyring:*
    - *Vurdering af nye eller igangværende risici i projektet, og eventuel justering af planer for at håndtere dem.*
- *Budgetkontrol:*
    - *Gennemgang af projektets økonomi og sikring af, at det holder sig inden for budgettet.*
- *Leverancestyring:*
    - *Opfølgning på leverancer og sikring af, at de opfylder de aftalte krav og mål.*
- *Planlægning og opfølgning:*
    - *Udarbejdelse og opdatering af projekt- og detailplaner samt opfølgning på de enkelte opgaver og milepæle.*
- *Beslutningsgrundlag:*
    - *Projektlederen sikrer, at beslutninger og retningslinjer fra styregruppen bliver implementeret, og fremlægger spørgsmål til styregruppen for beslutning.*
- *Interessenthåndtering:*
    - *Koordinering og opfølgning med eksterne leverandører og andre interessenter.*

- *Teamkoordination:*
    - *Fordeling af arbejdsopgaver til teammedlemmer og facilitering af statusmøder med arbejdsgrupperne.*

Styrergruppemøder:

Styregruppen består af personer fra Kunde og Leverandør med beslutningskompetencer. På styregruppemøder træffer styregruppen de overordnede beslutninger og sikrer, at projektet lever op til de strategiske mål og projektbeskrivelsen. Projektlederen leverer information om projektets fremdrift, afslutning af faser, og eventuelle udfordringer, der kræver styregruppens opmærksomhed. Styregruppen godkender større dele af leverancer, styrer ressourcer og økonomi, og sikrer, at resultaterne forankres i organisationen.

Styregruppens rolle og ansvar

- ***Overordnet ansvar:***
    - *Styregruppen har det overordnede ansvar for projektets succes og holder det på rette spor i henhold til projektets formål og succeskriterier.*
- ***Beslutningstagning:***
    - *Styregruppen træffer beslutninger vedrørende projektets rammer, ressourcer, tidsplan og eventuelle ændringer i scope.*
- ***Strategisk forankring:***
    - *Styregruppen sikrer, at projektet stemmer overens med organisationens overordnede strategier og at resultaterne bliver godt modtaget og forankret på tværs af afdelinger.*
- ***Ressourceallokering:***
    - *Styregruppen er ansvarlige for projektets økonomi og sikrer de nødvendige ressourcer og kapital.*
- ***Orientering:***
    - *Projektlederen orienterer styregruppen om projektets aktuelle status, herunder fremskridt, budget, tidsplan og eventuelle risici.*
- ***Faseafslutninger:***
    - *Styregruppen godkender typisk afslutningen af en projektfase og de store delleverancer, der er produceret.*
- ***Beslutningspunkter:***
    - *Styregruppemøderne fokuserer ofte på at træffe vigtige beslutninger, der enten kræver styregruppens godkendelse eller deres godkendelse af større dele af leverancerne.*

- ***Afklaring af akutte udfordringer:***
    - *Hvis der opstår uforudsete problemer eller akutte udfordringer, mødes styregruppen for at finde løsninger.*
- ***Strategiske beslutninger:***
    - *Styregruppen kan diskutere og beslutte om ændringer i projektets formål eller leverancer som følge af ændringer i omgivelserne eller strategiske prioriteringer.*
- ***Styregruppeaftale:***
    - *Det anbefales at have en styregruppeaftale, som definerer medlemmernes roller og ansvar, hvilket sikrer en forventningsafstemning og understøtter en effektiv ledelsesmæssig styring af projektet.*

Beskrivelse af eskalation af fejl og andre uoverensstemmelser i samarbejdet mellem Kunden og Leverandør.

Eskalation af fejl og andre uoverensstemmelser i samarbejdet vil foregå efter følgende procedure

- *Projektleder fra Kunden og Leverandøren mødes løser uoverensstemmelsen*
- *Styregruppen præsenteres for uoverensstemmelser og ser om de kan afklare og løse uoverensstemmelsen*
- *Leverandørens Direktør for konsulenterne og Kundens Vicedirektør mødes for at afklare og løse uoverensstemmelsen*
- *Leverandørens Head of Public 360 og Kundens Adm. direktør mødes for at afklare og løse uoverensstemmelser.*
- *Parterne kan vælge at anvende en moderator for at løse uoverensstemmelsen.*

En redegørelse for, hvordan sygdom og andet fravær håndteres.

Sygdom

- *Ved kortere sygdom orienteres Kunden omkring fraværet og hvorledes projektet opretholder sin fremdrift uden tab af tid.*
- *Ved længerevarende sygdom vil medarbejderen blive erstattet af en ny medarbejder med de kompetencer, der er nødvendige for at sikre fremdrift i projektet. Den nye medarbejder vil blive præsenteret for Kunden inden opstart.*

Planlagt ferie:

- *Ferie er medtaget i projektplanen og vil derfor ikke påvirke fremdriften.*

Medarbejder stopper i ansættelse hos Leverandøren

- *Udskiftning af medarbejder vil blive foretaget med udgangspunkt i at sikre fremdriften i projektet. Den ny Medarbejders kompetencer skal derfor indpasses i den samlede bemanding af projektet, der sikrer en succesfuld implementering. Kunden vil blive orientere omkring medarbejder kompetencer og hvorledes justering og planlægning af det resterende projekt vil forløbe succesfuld.*

3 Incident Management

Leverandørens Kundeservice sikrer, at hændelser (incidents) igangsættes, eskalerer og løses i overensstemmelse med reaktions- og løsningstider aftalt i Bilag 1.1 Servicemål (SLA).

Leverandørens Kundeservice kan yde assistance ved teknisk fejlfinding af kundespecifikke spørgsmål, fejlfinding af adgangskontrol, installation og konfigurering af software på den enkelte brugers PC. Assistance udføres som en konsulentydelse efter Leveringsdato.

Serviceperiode

Leverandørens Kundeservice er tilgængelig for Kunden i ordinær arbejdstid, som er kl. 08.00–16.00 på hverdage (mandag–fredag) (Tjenesteperioden).

Leverandørens Serviceportal er tilgængelig for Kunden døgnet rundt.

Leverandøren har medarbejder på arbejde, som overvåger Cloud-tjenesten døgnet rundt. I tilfælde af driftstop, også uden for Tjenesteperioden, påbegyndes teknisk fejlfinding, så snart meddelelse modtages fra Cloud-tjenesten.

Kunden kan bestille support uden for Tjenesteperioden, hvis Kunden anser dette for nødvendigt. Omfanget aftales med Leverandøren.

Sprog

Ved login på Leverandørens Serviceportal kan Kunden vælge mellem forskellige sprog. Hjælpeteksten i Cloud-tjenesten er på dansk.

4 Supportmanagement, herunder rapportering af fejl

Leverandørens Serviceportal er Leverandørens løsning for IT Service Management og platformen for kommunikation mellem Kunden og Leverandøren efter Leveringsdatoen.

Kunden skal udpege dedikerede kontaktpersoner (Superbrugere), som får adgang til Leverandørens Serviceportal og bliver kontaktpunktet mellem Kunden og Leverandøren. Superbrugerne skal have kendskab til Cloud-tjenesten og holde sig opdateret om ændringer og nye versioner. Hvis Kunden har behov for at skifte Superbruger, skal Leverandøren underrettes for at lette dette.

Superbrugere kan indtaste bestillinger og tilbudsanmodninger samt registrere sager i Leverandørens Serviceportal. Sager kan være anmodninger om brugersupport eller fejlrapportering.

Med "brugersupport" menes spørgsmål fra Kunden af funktionel eller teknisk karakter, som ikke dækkes af Hjælp-funktionen, uddannelsesmateriale eller anden tilgængeliggjort dokumentation. Med "fejlrapportering"

menes i denne sammenhæng rapportering af uplanlagt afbrydelse i Cloud-tjenesten eller forringelse af kvaliteten af Cloud-tjenesten, se Bilag 1.1 Servicemål (SLA). afsnit 4.5 ”Kategorisering og afhjælpning af Fejl”.

Superbrugerne skal følge op på registrerede sager og bistå internt hos Kunden.

Alle sager følges op af Leverandøren og besvares med et forslag til løsning. Sagen afsluttes automatisk ved Kundens godkendelse af forslaget til løsning, eller efter 7 (syv) kalenderdage, hvis Kunden ikke svarer. Kunden kan i denne periode også afvise forslaget til løsning.
