Bilag 6.i Implementeringsplan

Dynamisk Indkøbssystem 02.19 Fagsystemer (2024)

Kontrakt om levering af ESDH løsning til Danmarks Nationalbank

SKI0219.2503.0030

Version 1.0

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Montagehallen | Pakkerivej 6, 2500 Valby
Telefon +45 33 42 70 00 | CVR 17472437

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Antagelser, der er afspejlet i tidsplanen 2
2 Implementeringstidsplan for Servicen 3
2.1 Overblik over aktiviteter og milepæle i implementeringstidsplanen 4
2.2 Afklaringsfasen 5
2.3 Etablering af miljøerne 7
2.4 Implementeringsfasen 8
2.4.1 Etablering af Kundens ESDH-løsning 8
2.4.2 Datamigrering 9
2.4.3 Uddannelse 10
2.4.4 Overtagelsesprøve og ibrugtagning af Løsningen 10

1 Indledning

Leverandøren har i nærværende bilag beskrevet implementeringsplanen for den tilbudte Service i henhold til kundens krav i bilag 6 Implementering.

Leverandørens besvarelse af nærværende bilag er opdelt i en række emner og underbilag for at øge læsevenligheden og kvaliteten af besvarelsen:

- Beskrivelserne i dette Bilag 6.i giver en detaljeret gennemgang af Leverandørens implementeringstidsplan og Leverandørens proces for risikostyring for at give Kunden indsigt i hvorledes en succesfuld implementering opnås og Kundens bidrag til samme.
- "Underbilag 6A – Implementeringstidsplan" angiver den samlede implementeringstidsplan.
- Underbilag 6B – Testplan beskriver den teststrategi, der er planlagt for implementeringen af Servicen

1.1 Antagelser, der er afspejlet i tidsplanen

1) Det er Leverandørens opfattelse, efter gennemlæsningen af udbudsbilagene, at Kunden ønsker at holde Kundens tidsforbrug og involvering så lavt som muligt.

   Dette medfører fx at Kunden ikke deltager i konfigurationen af Løsningen.

   Kunden ønsker ikke at have en aktiv deltagelse i test af Løsningen udover de områder, der kræver en aktiv deltagelse, som fx test af migreringen og UAT.

Ad 1) Leverandøren leverer et standardsystem der skal konfigureres iht. kravene, og de justeringer, der vil være nødvendige ift. resultatet af de planlagte afklaringsworkshops.

Leverandøren vil derefter kunne konfigurere Løsningen uden Kundens involvering, hvilket Tidsplanen afspejler.
Leverandøren tilrettelægger implementeringen, så kundens tidsforbrug optimeres mest muligt, uden at det går ud over kvalitet og nødvendige beslutningsprocesser.

Hvis antagelsen er forkert, og Kunden ønsker en større grad af involvering, kan konfiguration af Løsningen også ske ifm. sidemandsoplæring, hvor Kundens Fagansvarlige lærer at konfigurere Løsningen, og derved selv vil være i stand til at vedligeholde og konfigurere Løsningen efterfølgende. Hvis denne tilgang skulle ønskes, og antagelsen ikke er korrekt, vil tidsplanen blive justeret sammen med Kunden i Afklaringsfasen. Timeforbruget for de Fagansvarlige ville derved skulle forhøjes.

Ved en minimumsindsats fra Kundens side ift. test er der i tidsplanen planlagt med, at Kundens Testansvarlige får tilsendt drejebøgerne for de planlagte test, Leverandøren tester, og Kundens Testansvarlige får tilsendt Leverandørens Testrapport og godkender denne.

Det er vigtigt at bemærke, at en ændring af Kundens involvering i implementeringsfasen ikke vil påvirke milepælene i Tidsplanen, de anførte datoer, vil ikke ændres ved en større grad af kundeinvolvering.

2 Implementeringstidsplan for Servicen

Leverandørens udarbejdede implementeringstidsplan for Servicen baserer sig på et scenarie 2, hvor Kunden ikke allerede har Leverandørens Service i brug.

Tidsplanen er udarbejdet med tanke på at skabe tryghed og stabilitet for Kunden under implementeringsforløbet og for at sikre Kunden den optimale idriftsættelse ift. de fastsatte krav og overgang til support og vedligeholdelse. Der tilbydes således et fast tilknyttet kundeteam med dyb viden om Servicen og dens muligheder, hvor Leverandøren også kan inddrage specialkompetencer for Leverandørens produkthus, hvis det vurderes gavnligt.

Leverandørens tidsplan tilgodeser en kort, smidig og sammenhængende proces for brugeren ved overgangen til Servicen, så den kan anvendes straks efter implementeringen.

Alle relevante aktiviteter, produkter og leverancer er medtaget og detaljeret med milepæle, så der skabes grundlag for, at Kunden og Leverandøren kan estimere og planlægge ressourceindsats.

Den er desuden detaljeret med afhængigheder, ansvarlig og deltagende, så Kunden får et retvisende billede af forløbet. Den samlede detaljerede tidsplan er vedlagt i "Underbilag 6A – Implementeringstidsplan".

Leverandøren har gjort sig følgende antagelser og forudsætninger i forbindelse med udarbejdelse af implementeringstidsplanen:

- Kunden og Leverandøren indgår i kontraktforhold senest i den 21.01.2026
- Tidsplanen tager højde for skoleferier og helligdage. Skoleferier er i tidsplanen fastsat til:
    - vinterferie i uge 7 2026,
    - påskeferie i uge 14 2026
    - sommerferie uge 27-29 2026

I disse perioder er der ingen arbejdsdage planlagt.

- Der er afsat tid til en afklaringsfase inden implementeringsfasen påbegyndes. Kunden har i Bilag 6 ønsket, at afklaringsfasen maksimalt må have en varighed af tyve arbejdsdage. Leverandøren planlægger med en start på afklaringsfasen straks efter kontraktindgåelsen, den 21.01.2026. Dvs. at Afklaringsfasen påbegyndes den 22.01.2026 og skal slutte senest 20 arbejdsadage derefter, hvilket vil være den 25.02.2026. Dette er indarbejdet i planen.
- Tidsplanen stiller forventninger til, at både Kunden og Leverandøren den nødvendige ressourceallokering og beslutningsdygtighed til rådighed for at tidsplanen kan overholdes. Tidsplanen vil blive endelig fastlagt ifm. afklaringsfasens udgang i samarbejde med Kundens projektleder.

2.1 Overblik over aktiviteter og milepæle i implementeringstidsplanen

Implementeringsplanen er skitseret på et overordnet niveau i nedenstående tabel, så Kunden kan danne sig et overblik over hvilke perioder de forskellige aktiviteter forventes afviklet:

Aktivitet	1. kvartal 2026			2. kvartal 2026			3. kvartal 2026			4. kvartal 2026		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept			
Afklaringsfase												
Implementeringsfase												
Overtagelsesprøve												
Idriftsættelse									07.09			
Hypercare												

Implementeringstidsplanen har 7 milepæle, som hver identificerer afslutningen på en fase og/eller større opgave i implementeringsprojektet og som alle er klart defineret i første kolonne i implementeringstidsplanen:


- M0 – Kontraktunderskrift
- M1 – Godkendt Løsningsdesign
- M2 – Afslutning af afklaringsfasen
- M3 – Godkendt testrapport for Leverandørens test af ESDH-servicen på Kundens testmiljø
- M4 – Godkendelse af migrering af data fra Kundens eksisterende løsninger
- M5 – Godkendelse af overtagelsesprøve (UAT) for Servicen
- M6 – Idriftsættelse af Servicen
- M7 – Afslutning af Hypercare perioden

I næstkommende afsnit vil Leverandøren lave en detaljeret gennemgang af de enkelte aktiviteter i implementeringstidsplanen, så Kunden opnår en indsigt i Kundens forventede deltagelse og timeforbrug i de forskellige faser og aktiviteter, samt hvad disse indeholder.

2.2 Afklaringsfasen

GANTT-DIAGRAM

	M	Aktivitet	Varighe	Startdato	Slutdato	Afhæng	Ansvalig;Deltager
1		**Kontraktunderskrift**	**1 dag**	**on 21-01-26**	**on 21-01-26**		
2	M0	Underskrivelse af kontrakt	1 dag	on 21-01-26	on 21-01-26		Kunde;Leverandør
3		**Afklaringsfase**	**19,5 dage**	**to 22-01-26**	**on 25-02-26**	**1**	
4		Introduktion til parternes projektorganisation og etablering af samarbejdsorganisation	0,5 dage	to 22-01-26	to 22-01-26	2	Leverandør;Kunden
5		**Projektstyring**	**9,5 dage**	**fr 23-01-26**	**to 05-02-26**		
6		**Afklaringsforløb for risikovurdering**	**8,5 dage**	**fr 23-01-26**	**on 04-02-26**		
7		Møde om risikovurdering	0,5 dage	fr 23-01-26	fr 23-01-26	4AS+1 dag	Leverandør; Kunden: PL, Fagansvarlig, Systemansvarlig
8		Løbende dialog og tilpasning til risikovurdering	7 dage	ma 26-01-26	ti 03-02-26	7	Leverandør;PL (Kundens)
9		Afklaring af endeligt risikoniveau for servicen	1 dag	on 04-02-26	on 04-02-26	8	Leverandør;PL (Kundens)
10		**Afklaringsforløb for implementeringstidsplan**	**8,5 dage**	**ma 26-01-26**	**to 05-02-26**		
11		Afklaringsmøde om implementeringstidsplan	0,5 dage	ma 26-01-26	ma 26-01-26	4AS+2 dage	Leverandør; Kunden: PL, Fagansvarlig,
12		Afklaring af uddannelsesforløb og planlægning	0,25 dage	ti 27-01-26	ti 27-01-26	11	Leverandør; Kunden: PL, Fagansvarlig,
13		Indarbejdelse af aftalte ændringer i implementeringstidsplan	5 dage	ti 27-01-26	ma 02-02-26	11	Leverandør
14		Fremsendelse af revideret implementeringstidsplan til Kunden	0 dage	ma 02-02-26	ma 02-02-26	13	Leverandør
15		Godkendelse af implementeringstidsplan	3 dage	ti 03-02-26	to 05-02-26	14	PL (Kundens)
16		**Afklaringsforløb for betalingsplan**	**8,5 dage**	**ma 26-01-26**	**to 05-02-26**		
17		Møde om betalingsplan	0,5 dage	ma 26-01-26	ma 26-01-26	4AS+2 da	Leverandør;PL (Kundens)
18		Udarbejdelse af betalingsplan	5 dage	ti 27-01-26	ma 02-02-26	17	Leverandør
19		Fremsendelse af betalingsplan	0 dage	ma 02-02-26	ma 02-02-26	18	Leverandør
20		Godkendelse af betalingsplan	3 dage	ti 03-02-26	to 05-02-26	19	PL (Kundens)
26		**Afklaringsforløb om integrationer**	**8,5 dage**	**on 28-01-26**	**ma 16-02-26**		
27		Teknisk workshop om standardintegrationer og Calypso	0,5 dage	on 28-01-26	on 28-01-26	4AS+4 dage	Leverandør; IT-Arkitekt (Kunden)
28		Udarbejdelse af evt. præciseringer og/eller suppleringer til krav og forhold til standardintegrationer og Calypso	5 dage	to 29-01-26	on 04-02-26	27	Leverandør; IT-Arkitekt (Kunden)
29		Fremsendelse af evt. Præciseringer og/eller suppleringer til forhold til standardintegrationer og Calypso	0 dage	to 05-02-26	to 05-02-26	28	Levarandør
30		Godkendelse af præciseringer og/eller suppleringer til forhold til standardintegrationer og Calypso	3 dage	to 05-02-26	ma 16-02-26	29	IT-Arkitekt (Kunden)
31		**Løsningens funktioner og konfigurationsmuligheder**	**16 dage**	**ma 26-01-26**	**ti 24-02-26**		
32		Workshop vedr. konfigurationsmuligheder i Løsningen	1 dag	ma 26-01-26	ti 27-01-26	4AS+2 dage	Leverandør; Fagansvarlig (Kunden)
33		Afklaringsworkshop vedr. specifikke funktionelle områder (Fx Teams, aktindsigt og kontrakthåndtering)	1 dag	ti 27-01-26	on 28-01-26	32	Leverandør; Fagansvarlig (Kunden)
34		Konfigurationsworkshop - Kundespecifik konfiguration	1 dag	on 28-01-26	to 29-01-26	33	Leverandør; Fagansvarlig (Kunden)
35		Udarbejdelse og dokumentation af Løsningsdesign	5 dage	to 29-01-26	to 05-02-26	34	Leverandør
36		Fremsendelse af Løsningsdesign til Kundens godkendelse	0 dage	to 05-02-26	to 05-02-26	35	Leverandør
37		Kundens review af Løsningsdesign	5 dage	to 05-02-26	to 19-02-26	36	Fagansvarlig (Kunden)
38		Håndtering af Kundens evt. kommentarer til ESDH-løsningsdesign	3 dage	to 19-02-26	ti 24-02-26	37	Leverandør
39	M1	Godkendt Løsningsdesign	1 dag	ti 24-02-26	on 25-02-26	38	Fagansvarlig (Kunden)
40	M2	**Afslutning af afklaringsfasen**	0 dage	on 25-02-26	on 25-02-26	39	

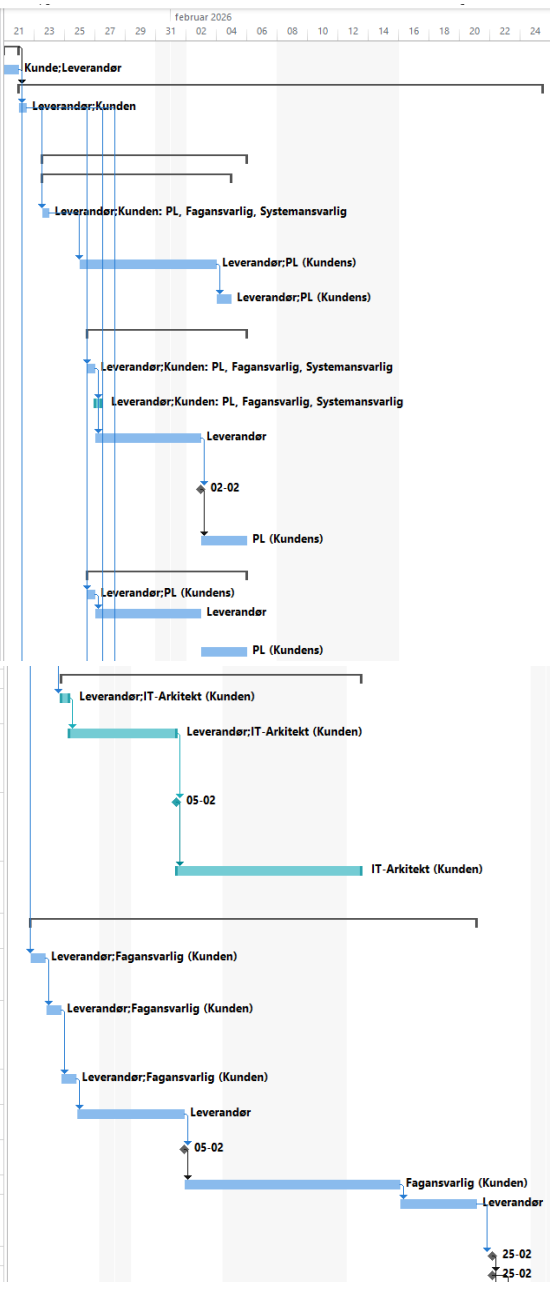

Figur 1 - Afklaringsfasen

Afklaringsfasen starter med et fællesmøde hvor parterne introduceres, samarbejdsorganisationen etableres og tidsplan for næstkommende aktiviteter gennemgås for identificering af eventuelle bemærkningspunkter fra Kunden til samme.
Leverandøren allokerer et fast team til projektet, der består af Leverandørens projektleder, Forretningskonsulenter, Forretningsarkitekt og Udviklere. Leverandørens team er med i hele projektforløbet. Fra Afklaringsfasen til afslutningen af projektet. På den måde sikres det at Leverandøren får et indgående kendskab til Kunden og Kundens krav til Løsningen, og at viden opbygges kontinuerligt.
Efter opstartsmødet igangsættes 6 afklaringsforløb med forskellige temaer:

- **Afklaringsforløb om risikovurdering:**
  Forløbet starter med et halvdagsmøde, hvor risikovurdering drøftes og uklarheder identificeres, så de kan behandles – både i dette spor og sideløbende spor – inden afklaringsfasens afslutning, og det endelige risikoniveau for Servicen kan fastlægges.
  Det forventes, at Kundens projektleder, fagansvarlig og systemansvarlig deltager i dette forløb

Beskrivelse af Leverandørens proces for risikostyring i implementeringen

Udover de beskrevne testprincipper, -metoder og -værktøjer i "Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens prøveprincipper, metoder og -værktøjer", som også indgår i Leverandørens overordnede risikostyringsstrategi, omfatter Leverandørens risikostyring flere elementer der identificerer, vurderer og styrer potentielle risici, som kan påvirke Servicens eller leverancens succes, overholdelse af leveringstidspunkter og opfyldelse af leverance- og servicemål:

- **Risikoidentifikation**: Som det indledende skridt identificeres potentielle risici, der kan påvirke implementeringen og driften af løsningen. Dette indebærer brug af Leverandørens erfaringer fra tidligere lignende projekter, inddragelse af interessenter og ekspertise samt en grundig gennemgang af krav og kontekst. Identifikationen omfatter blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og operationelle faktorer. Identificerede risici nedfældes i projektstyringsværktøjet ”Risikolog” til videre behandling.
- **Risikovurdering**: Når risici er identificeret, vurderes de for at bestemme deres sandsynlighed og indvirkning på implementeringen og løsningen. Risikofaktoren fastlægges og sammenholdes med risikokonsekvensen i en matrice.
- **Risikobehandling**: Kunden og Leverandørens Projektledelse har som fast dagsordenspunk på Projektstyringsmøderne, at monitorere de identificerede risici og mitigerende handlinger.
- **Risikokommunikation**: Kunderne bliver løbende opdateret om de identificerede risici, deres mulige konsekvenser samt de tiltag, der er iværksat for at håndtere dem. Dette sikrer, at alle relevante parter er opmærksomme på potentielle risici og er forberedte på at håndtere dem.
- **Overvågning og kontrol**: Risikostyringen er en kontinuerlig proces, hvor risici regelmæssigt identificeres, overvåges og kontrolleres, hvilket sikrer, at der findes en handlingsplan til at håndtere dem.

- **Afklaringsforløb for implementeringstidsplan:**
  Dette forløb har til formål at fastsætte en **en**delig tidsplan for implementeringsfasen inden afslutningen af afklaringsfasen. Forløbet starter med et halvdagsmøde, hvor tidsplanen og afhængigheder gennemgås i detaljer, og hvor Kunden kan påpege eventuelle udfordringer.
  Der er også planlagt med et særskilt møde, hvor uddannelsesplanen gennemgås. Leverandøren kender ikke pt. Kundens ønsker til valg af uddannelsespakker, og antal brugere, der skal undervises, og har derfor afsat tid i Afklaringsfasen til at få lagt uddannelsessporet ind i tidsplanen, så det passer med Kundens behov og ønsker herfor. Leverandøren vil være ansvarlig for at integrere de identificerede ændringer i implementeringstidsplanen.
  Det forventes, at Kundens projektleder og fagansvarlige deltager i dette forløb.

- **Afklaringsforløb for betalingsplan:**
  Forløbet starter med et møde, hvor Kunden og Leverandøren drøfter og afklarer input til betalingsplanen. Derefter udarbejder Leverandøren en betalingsplan, som Kunden skal godkende inden afslutningen af afklaringsfasen.
  Det er forventet, at Kundens projektleder deltager i dette forløb som repræsentant for Kunden.

- **Afklaringsforløb om Kundens IT-miljø:**
  Dette forløb er mere teknisk orienteret end de andre, da det har til formål at afklare forhold vedrørende Kundens fremtidige IT-miljø og tilhørende krav. Det forventes, at Kundens systemansvarlige som minimum deltager, og at Kundens driftsansvarlige og projektleder inddrages, hvor Kunden finder det relevant.

- **Afklaringsforløb om integrationer:**
  Dette forløb er mere teknisk orienteret end de andre, da det har til formål at afklare forhold vedrørende Kundens fremtidige IT-miljø og tilhørende krav. Det forventes, at Kundens systemansvarlige som minimum deltager, og at Kundens driftsansvarlige og projektleder inddrages, hvor Kunden finder det relevant.

- **Afklaring af konfigurationsmuligheder og andre funktionelle krav til Servicen:**
  Dette forløb har til hensigt at give Kunden en forståelse af Servicens funktionelle muligheder, med særlig fokus på de områder af Løsningen, som Kunden har prioriteret i sine krav, samt Kundens mulighed for at konfigurere Løsningen.
  Efter introduktionen til Leverandørens ESDH-løsning og konfigurationsmulighederne afholdes en konfigurationsworkshop. Denne workshop baserer sig på Kundens beskrevne krav og involverer velinformerede repræsentanter fra Kunden, som har indsigt i Kundens forretningsbehov. Workshop vil omhandle Kontraktens definerede krav til konfiguration. Resultaterne fra workshoppen dokumenteres af Leverandøren i et løsningsdesign af Kundens krav, som Kundens fagansvarlige og systemansvarlige gennemgår og godkender, inden projektet går videre til etableringsfasen.

2.3 Etablering af miljøerne

41	**Etablering af miljøer**	**16,5 dage**	**to 22-01-26**	**fr 20-02-26**		
42	Etablering af test- og produktionsmiljø samt migreringsmiljø (servere, basissoftware og testklienter)	15 dage	to 22-01-26	on 18-02-26	2	Leverandør
43	Installation af standardprogrammel (Public 360° + relevante moduler) og basiskonfiguration I test- og produktionsmiljø	1 dag	to 19-02-26	to 19-02-26	42	Leverandør
44	Installationstest I Kundens test- og produktionsmiljø	0,5 dage	fr 20-02-26	fr 20-02-26	43	Leverandør



Figur 2 – Etablering af miljøerne

Samtidig med afviklingen af Afklaringsfasen påbegynder Leverandøren arbejdet med opsætningen af Kundens IT-miljøer, test- produktions- og migreringsmiljøet. Under opsætningen af miljøerne installeres standardsoftware og basiskonfigurationen laves. Leverandøren gennemfører altid en installationstest. Kunden får resultatet af installationstesten i afslutningsrapport, når den er gennemført med positivt resultat, men er ikke forventet at stille med nogen ressourcer i dette forløb.


Installationstesten og den forløb er detaljeret beskrevet under afsnittet ”Installationstest” i ”Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens testprincipper, metoder og -værktøjer ”.

2.4 Implementeringsfasen

I denne fase, etableres Løsningen jf. Kundens krav og godkendte løsningsdesign, migreringsforløbet gennemføres, og integrationerne etableres. Leverandøren gennemfører løbende test af konfigurationen, migreringen af data og af integrationerne. I forbindelse med samtlige test i denne fase, fremsender Leverandøren en testdrejebog og en testrapport til godkendelse. Fasen afsluttes med en af Leverandøren komplet og testet Løsning, der er klar til Kundens overtagelsesprøve (UAT).

2.4.1 Etablering af Kundens ESDH-løsning

45		**Implementeringsfasen**	**102,5 dag**	**on 25-02-26**	**to 20-08-26**		
46		**Etablering af Kundens ESDH-Service**	**102,5 dag**	**on 25-02-26**	**to 20-08-26**		
47		**Implementering af den kundespecifikke konfiguration og gennemførsel af Leverandørens egne prøver**	**62,5 dage**	**on 25-02-26**	**on 03-06-26**		
48		Implementering af kundespecifik konfiguration + udarbejdelse af Testcases	20 dage	on 25-02-26	on 25-03-26	39	Levarandør
49		Implementering af relevante standardintegrationer (CVR, CPR og Digital Post)	1 dag	on 25-03-26	to 26-03-26	48	Leverandør; IT-Arkitekt (Kunden)
50		Implementering af Kundespecific integration (Calypso)	3 dage	ti 05-05-26	to 07-05-26	48AS+1 dag	Levarandør
51		Fremsendelse af leverandørens Testplan	1 dag	fr 08-05-26	fr 08-05-26	50	Leverandør
52		Kundens godkendelse af Leverandørens testplan og testcases	3 dage	ma 11-05-26	on 13-05-26	50AS+1 dag	Fagansvarlig (Kundens)
53		Leverandørens test på Kundens testmiljø	10 dage	fr 15-05-26	fr 29-05-26	52	Leverandør
54		Fremsendelse af Leverandørens Testrapport	0 dage	fr 29-05-26	fr 29-05-26	53	Levarandør
55	M3	Godkendelse af Leverandørens Testrapport	3 dage	ma 01-06-26	on 03-06-26	53	Fagansvarlig (Kunden)

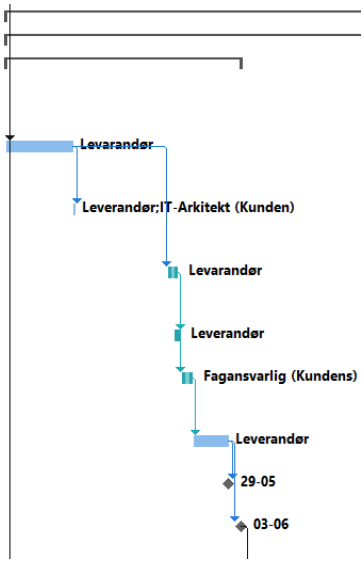

Figur 3 – Etablering af Kundens ESDH-løsning

Med udgangspunkt i det godkendte løsningsdesign fra Afklaringsfasen, konfigurerer Leverandøren Løsningen og udarbejder de dertilhørende testcases, som Kundens Fagansvarlige får til gennemsyn og godkendelse.


Leverandøren vil være udførende på konfiguration af Løsningen i henhold til Kundens krav. Når Kundens konfiguration er afsluttet, sætter Leverandøren aftalte standardintegrationer og integrationen til Calypso op og foretager en fuld test af Løsningen.

Kunden er i processen velkommen til at få vist Løsningen, når ønsket. Men overordnet set, så skulle kravene til Løsningen være klarlagte efter Afklaringsfasen, og Kundens involvering kan begrænses til godkendelsen af de udarbejdede testcases, og slutteligt, godkendelsen af testrapporten.

Forløb for denne test og forudsætninger for samme er beskrevet uddybet i afsnittet ”Leverandørens egne prøver” i ”Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens testprincipper, metoder og -værktøjer” i Underbilaget beskriver Leverandøren også uddybende hvilken kvalitetssikring og hvilke tests, som Leverandørens ESDH-service gennemgår, inden Servicen forlader Leverandørens produkthus og installeres på Kundens miljøer for dermed at begrænse risici og optimere Leverandørens og Kundens tidsforbrug i selve implementeringen.

2.4.2 Datamigrering

56		**Datamigrering**	**101,5 dag**	**to 26-02-26**	**to 20-08-26**		
57		**Fastlæggelse af udtræksformat og modtagelse af dataudtræk**	**15,25 dage**	**to 26-02-26**	**to 19-03-26**		
58		Møde om udtræksformat med Kundens eksisterende leverandør af ESDH-Service 'TeamShare'	0,25 dage	to 26-02-26	to 26-02-26	40AS+1 dag	Leverandør;3.parts leverande
59		Modtagelse af data i aftalt format fra Kundens eksisterende ESDH-Service "Teamshare"	0 dage	to 19-03-26	to 19-03-26	58AS+15 dage	3.parts leverandør;Leverande
60		**Migrering af data til Kundens nye Løsning**	**86,25 dage**	**to 19-03-26**	**to 20-08-26**		
61		Udarbejdelse af mapningsdokumenter for data fra eksisterende løsninger	15 dage	to 19-03-26	fr 17-04-26	59	Leverandør
62		Konverterings- og mapningsworkshop omhandlende data fra eksisterende ESDH-løsning "Teamshare"	1 dag	fr 17-04-26	ma 20-04-26	61	Leverandør; Fagansvarlig (Kunden)
63		Kundens behandling af evt. udestående mapninger efter workshops	5 dage	ma 20-04-26	ma 27-04-26	62	Fagansvarlig (Kunden)
64		Udarbejdelse af scripts til migrering af data fra Kundens eksisterende løsninger	15 dage	ma 27-04-26	ti 19-05-26	63	Leverandør
65		ESDH løsningens Kundespecifikke konfiguration lægges på migreringsmiljøet	3 dage	ma 08-06-26	on 10-06-26	55AS+1 dag	Leverandør
66		Gennemførsel af prøvemigrering fra Kundens eksisterende løsninger og Leverandørens test af samme	15 dage	to 11-06-26	on 22-07-26	65	Leverandør
67		Konverteringstest af prøvemigrering fra Kundens eksisterende løsninger	5 dage	to 23-07-26	on 29-07-26	66	Kunde;Fagansvarlig (Kunden)
68		Evt. anden iteration af migreringsspor med ny konverteringstest	15 dage	to 30-07-26	on 19-08-26	67	Kunde;Fagansvarlig (Kunden)
69	M4	Godkendelse af migrering af data fra Kundens eksisterende løsninger	1 dag	to 20-08-26	to 20-08-26	68	Fagansvarlig (Kunden)

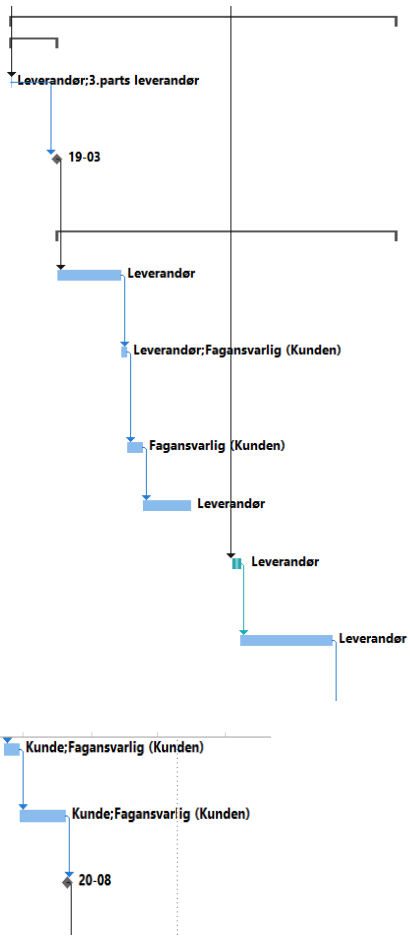


Figur 4 – Datamigrering

Sideløbende med opsætning af Løsningen og test af den, opstartes migreringssporet. Migreringssporet indledes med et møde med Kundens eksisterende leverandør af "Teamshare" for at fastlægge udtræksformat. Fordi Leverandøren modtager data i et specificeret format af Leverandøren, så reduceres risici i datamigreringen signifikant, da det sikres, at data modtages i et format, hvor data er læsbart og det klart hvad der tilhører hvilke objekter. Dermed kan Leverandøren også bedre rådgive Kunden om, hvordan mapning af data bør defineres.

Når Leverandøren har modtaget data og konverteringsmiljøet er etableret, udarbejder Leverandøren et udkast til et mapningsdokument, som gennemgås på en workshop med Kunden. Dette giver Kunden mulighed for at beslutte, hvorhen metadata skal mappes i den nye løsning, baseret på Leverandørens rådgivning. Det forventes, at Kundens fagansvarlige deltager i denne workshop. Derefter arbejder Leverandøren med at klargøre scripts og gennemføre en prøvemigrering. Kunden tester prøvemigreringen under den efterfølgende konverteringstest. Konverteringstesten og den detaljerede migreringsproces er beskrevet i afsnittet 2.3 Konverteringstest i "Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens testprincipper, metoder og - værktøjer". Herefter er der afsat tre uger til eventuelle tilbageløb, ny prøvemigrering og endelig godkendelse. Som resultat af migreringsforløbet udarbejdes en detaljeret drejebog for migreringens forløb, som anvendes ved den endelige migrering i lukkevinduet før idriftsættelse.

2.4.3 Uddannelse

70		**Uddannelse - Aftalt i Afklaringsfasen Nedenstående er et eksempel**	**9 dage**	**on 01-07-26**	**to 30-07-26**		
71		Superbrugerkursus	1 dag	ti 28-07-26	ti 28-07-26	78AS-20 d	Leverandør;Kunde
72		Train-the-trainerkursus	2 dage	on 29-07-26	to 30-07-26	71	Leverandør;Kunde
73		E-Learning materiale fremsendes	0 dage	on 01-07-26	on 01-07-26	72	Leverandør




Figur 5 – Uddannelse

Efter godkendelse af Konfigurationen af Løsningen i Kundens testmiljø, påbegyndes undervisningen af Kundens superbrugere. Undervisningsforløbet er aftalt i Afklaringsfasen. Det anbefales dog, at de planlægges således, at de ligger kort før Kunden skal teste i forbindelse med overtagelsesprøven (UAT) og dermed har alt i frisk erindring til testen

2.4.4 Overtagelsesprøve og ibrugtagning af Løsningen

74		**Overtagelsesprøve for Løsningen på Kundens Testmiljø**	**52 dage**	**fr 31-07-26**	**fr 09-10-26**		
75		**Forberedende aktiviteter for overtagelsesprøve**	**17 dage**	**fr 31-07-26**	**ma 24-08-26**		
76		Fremsendelse af drejebog, prøveplan og testcases for overtagelsesprøve	1 dag	fr 31-07-26	fr 31-07-26	69AS-15 dage	Leverandør
77		Godkendelse af drejebog, prøveplan og testcases	5 dage	ma 03-08-26	fr 07-08-26	76	
78		Kopiering og restore af database med migrereret data fra konverteringsmiljøet på produktionsmiljø	2 dage	fr 21-08-26	ma 24-08-26	69	Leverandør
79		**Afholdelse af overtagelsesprøve**	**4 dage**	**ti 25-08-26**	**fr 28-08-26**		
80		Svartidstest	1 dag	ti 25-08-26	ti 25-08-26	78	Leverandør;Fagansvarlig (Kur
81		Fremsendelse af prøverapport for overtagelsesprøve	0 dage	ti 25-08-26	ti 25-08-26	80	Leverandør
82	M5	Godkendelse af overtagelsesprøve	3 dage	on 26-08-26	fr 28-08-26	81	PL (Kundens)
83		**Lukkevindue og ibrugtagning af Løsningen**	**19 dage**	**ti 01-09-26**	**to 24-09-26**		
84		Udlevering af opdaterede udtræk i aftalt format fra Kundens eksisterende løsninger	1 dag	ti 01-09-26	ti 01-09-26	82AS+1 dag	3.parts leverandør;Leverandø
85		Migrering af data til Kundens produktionsmiljø	2 dage	on 02-09-26	to 03-09-26	84	Leverandør
86		Kundens endelige verifikationstest af Servicen i lukkevindue	1 dag	fr 04-09-26	fr 04-09-26	85	Leverandør; Fagansvarlig (Kunden)
87	M6	Idriftsættelse af Løsning	0 dage	ma 07-09-26	ma 07-09-26		Levarandør
88		Fremsendelse af Afslutningsrapport	4 dage	ma 21-09-26	to 24-09-26	87	Leverandør
89		**Hypercare (3 uger)**	**15 dage**	**ma 21-09-26**	**fr 09-10-26**		
90		Hypercare start	0 dage	ma 21-09-26	ma 21-09-26	87	Levarandør

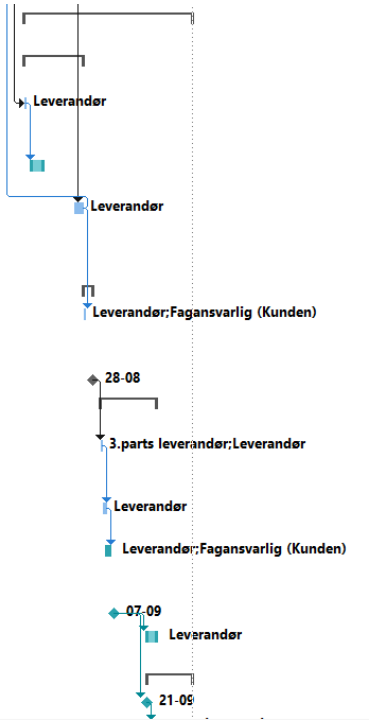

Figur 6 – Overtagelsesprøven

Når de indledende tests og konverteringstest er afsluttet og godkendt, kan forberedelserne til overtagelsesprøven begynde. Leverandøren vil inden overtagelsesprøvens start fremsende en detaljeret prøveplan, som beskriver prøvens forløb og forudsætninger. Overtagelsesprøven strækker sig over 9 arbejdsdage og omfatter forskellige tests af Servicens funktionsområde (funktions-, integrations-, svartids- og migreringstest), så den fulde Service er verificeret, inden den indstilles til Kundens godkendelse baseret på prøverapporten. Overtagelsesprøven og de enkelte tests omfang og forudsætninger beskrives detaljeret under afsnittet ”Overtagelsesprøve” i ”Underbilag 6B - Testplan og Leverandørens prøveprincipper, metoder og -værktøjer”. Det vil forventeligt være Kundens superbrugere og fagansvarlig, som deltager i aktiviteter relateret til overtagelsesprøven.

***Figur 9** - Oversigt over aktiviteter i forbindelse med idriftsættelse af Servicens ESDH-del.*

Efter godkendelsen af overtagelsesprøven er Servicens ESDH-del klar til drift. Idriftsættelsen forventes at kræve et lukkevindue på 4 dage (inkl. weekenden), da der skal migreres opdaterede data

fra Kundens nuværende "Teamshare" løsning, så alle de nyeste data er tilgængelige i den nye Service. Inden Servicen sættes i drift, vil Kunden udføre en endelig verifikationstest for at sikre, at data og løsningen er klar til Kundens brugere. Den præcise varighed af lukkevinduet vil blive fastlagt under prøvemigreringen, hvor Leverandøren vil udarbejde en detaljeret plan.
Efter ibrugtagningen, starter Hypercare perioden. Begrebet Hypercare betyder, at Leverandørens projektteam, stadig supporterer Kunden, i tilfælde af, at der skulle vise sig uhensigtsmæssigheder, der skal håndteres straks. Dvs. det er først efter Hypercare perioden, at Kundens Løsning overgår til almindelig support.
